


## HOOFDPUNTENRAPPORT

Programma	CfP-DCC-projecten
Van	Projectleader: Karín Chávez Caballero Projectofficer: Franciska Jansen
Aan	RDM-regiegroep Opdrachtnemer: Maurice Bouwhuis (Innovatiemanager Onderzoek) Programma manager: Mark Huijs
Periode van de rapportage	Mei t/m augustus 2022

### 1. SAMENVATTING

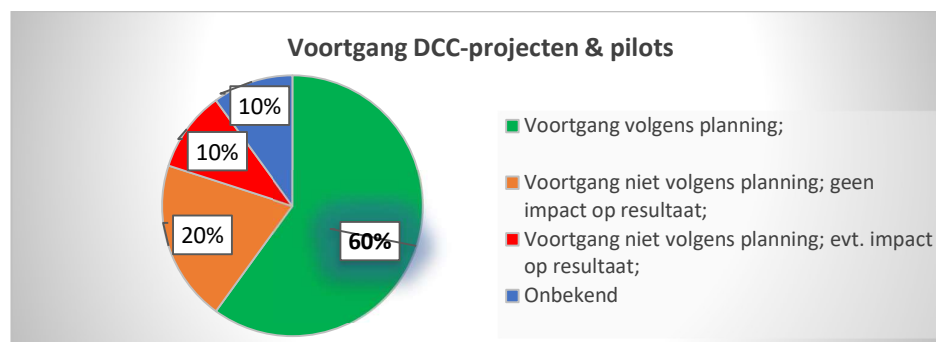

Nr.	Instellingnaam	Project- of pilootnaam	PL / penvoeder	Huidige status	Opmerkingen
01	Universiteit Twente	Pilot SRAM als Identity provider (IdP) voor UT-VRE	Hendri Hondorp	☹️	De pilot is inmiddels, in goed overleg met de projectleader en betrokkenen, gestopt.
02	Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, Rijksuniversiteit Groningen, UMC Groningen en Universiteit Maastricht	Project Your Virtual Research Assistant	Marcel Ras (VU)	😊	Inmiddels is het project gestart. De consortiumscopesafspraken zijn inmiddels helder en PL is sinds 1 juli gestart. De deadline is verlengd naar maart 2023 i.v.m. late projectstart vanwege late scopeafspraken en gebrek aan een PL.
03	Amsterdam UMC	Pilot Validatie Anonimisatie Tooling (VAT)	Jacob Rousseau	😬	Er is wat achterstand opgelopen met de selectie van de data om te annoteren i.v.m. onverwachte methodologische issues om representatieve datasets te maken. Dit wordt in de komende periode t/m november ingehaald.
04	Universiteit Utrecht, TU Eindhoven	Project ResearchCloud Community	E. Hakvoort	😊	M.u.v. ontwikkelcapaciteit binnen UU, ligt binnen

	en Wageningen Universiteit	Engagement	(UU)		de TUE het accent op de doorontwikkeling van anDREa. Ontwikkelcapaciteit voor DCC/Research-Cloud is zeer beperkt.
05	Universiteit Maastricht	Pilot Bootcamps: Towards Circular Science	Predro Hernández Serrano	😊	De pilot is inmiddels succesvol afgerond. Alle resultaten zijn bereikt binnen de geplande speerpunten m.u.v. tijd. Dit was i.v.m. afwezigheid van een PL.
06	Amsterdam UMC, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Netherlands eScience Center	Project Research Software Directory: software in de etalage	Ronald van Schijndel (Amsterdam UMC)	😊	M.u.v. het bepalen van algemene richtlijnen loopt wat vertraging op.
07	UMC Utrecht, Erasmus MC, Radboud UMC en UMC Groningen	Project Textmining in Nederlandstalige medische tekst	Mark Snackey (UMC Utrecht)	😞	De opgelopen vertraging is i.v.m. twee punten: 1) Wacht op ondertekening van geaccordeerde consortiumovereenkomst. 2) De uitdagende linux-vereisten voor het textmining platform heeft meer tijd in beslag genomen dan gepland, maar er blijft voldoende tijd over om de use cases naar behoren uit te voeren.
08	Universiteit van Amsterdam	Pilot Collaborative Oral History Research Environment (CORE)	Sanneke Stigter	😊	Qua resultaten lijkt het erop dat toegankelijkheid een fundamentele belemmering is. De richting is dat de omgeving (nog) niet geschikt gaat zijn voor de SSH doelgroep hun behoeften.
09	Radboud UMC	Pilot Building Containerized Workflow for FAIR Data Cube	Sander Bervoets	😊	Pilot is inmiddels succesvol afgerond.
10	Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, Wageningen Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam	Project FY4C – FAIR Yoda for communities - UL	Jacko Koster (UL)	onbekend	Geen voortgang ontvangen.

Legenda: 😊 = Voortgang volgens planning; 😞 = Voortgang niet volgens planning, maar met de verwachting dat het geen impact gaat hebben op het resultaat; 🚫 = Voortgang niet volgens planning, impact op resultaat, actie nodig.

## 2. VRAGEN AAN DE RDM REGIEGROEP

- Eventueel herinnering aan Universiteit Leiden van het rapporteren van projectvoortgang, via hoofdpuntenrapport.
